

Grupo 7 - Exercício 2

Gustavo G. França do Nascimento
15637551
T94

Kevin Rodrigues Nunes
15676030
T94

Kauã Lima de Souza
15674702
T94

Victor Yodono
13829040
T94

I. ATIVIDADES DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) apresenta a decomposição hierárquica do trabalho necessário para atingir os objetivos do projeto. O diagrama a seguir ilustra as principais fases e entregas.

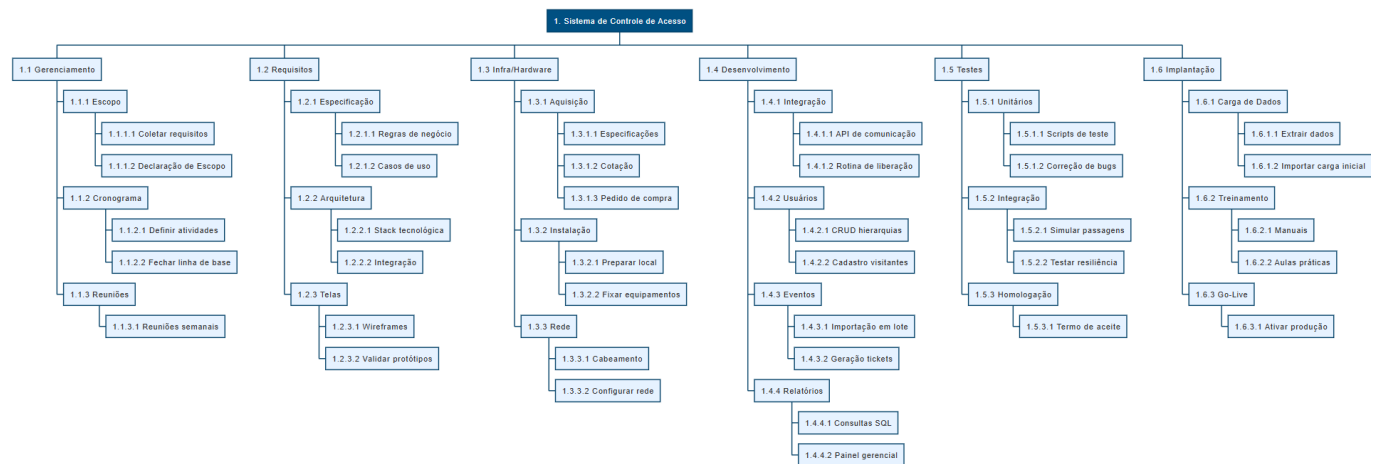


FIGURA I: ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

II. DURAÇÃO DAS ATIVIDADES

Em alinhamento aos processos de gerenciamento de tempo do PMBOK, os pacotes de trabalho oriundos da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) foram decompostos em atividades menores e gerenciáveis. Abaixo, apresentamos a tabela consolidada com as estimativas de duração, seguida pelo detalhamento das relações lógicas de precedência para a construção do cronograma.

ID	Atividade	Duração
1.1.1.1	Coletar requisitos	1 sem
1.1.1.2	Declaração de Escopo	1 sem
1.1.2.1	Definir atividades	1 sem
1.1.2.2	Fechar linha de base	1 sem
1.1.3.1	Reuniões semanais	24 sem
1.2.1.1	Regras de negócio	1 sem
1.2.1.2	Casos de uso	2 sem
1.2.2.1	Stack tecnológica	1 sem
1.2.2.2	Integração	2 sem
1.2.3.1	Prototipar Wireframes	1 sem
1.2.3.2	Validar protótipos	1 sem
1.3.1.1	Especificações	1 sem
1.3.1.2	Cotação	2 sem
1.3.1.3	Pedido de compra	4 sem
1.3.2.1	Preparar local	1 sem
1.3.2.2	Fixar equipamentos	2 sem
1.3.3.1	Cabeamento	1 sem
1.3.3.2	Configurar rede	1 sem
1.4.1.1	API de comunicação	3 sem
1.4.1.2	Rotina de liberação	2 sem
1.4.2.1	CRUD hierarquias	3 sem
1.4.2.2	Cadastro visitantes	2 sem
1.4.3.1	Importação em lote	2 sem
1.4.3.2	Geração tickets	1 sem
1.4.4.1	Consultas SQL	1 sem
1.4.4.2	Painel gerencial	2 sem
1.5.1.1	Scripts de teste	2 sem
1.5.1.2	Correção de bugs	1 sem
1.5.2.1	Simular passagens	1 sem
1.5.2.2	Testar resiliência	1 sem
1.5.3.1	Termo de aceite	1 sem
1.6.1.1	Extrair dados	1 sem
1.6.1.2	Importar carga inicial	1 sem
1.6.2.1	Manuais	1 sem
1.6.2.2	Aulas práticas	1 sem
1.6.3.1	Ativar produção	1 sem

TABELA I: ESBOÇO DA ESTIMATIVA DE DURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO.

III. REGISTRO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Em conformidade com a Política de Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa da disciplina ACH2027, declaramos explicitamente a utilização de IA como suporte ao aprendizado, ideação e estruturação deste documento. O quadro a seguir detalha os comandos utilizados, a ferramenta e a avaliação crítica dos resultados.

Registro de Uso de IA	Registro 01: Diagramação da EAP
Problema / Objetivo	Criar o diagrama visual da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e fazer um esboço da duração das atividades.
Ferramenta de IA	Gemini (Setembro/2026).
Comandos	”faça um esboço da estrutura analítica... precisa ser um diagrama”
Revisão dos resultados	Analizamos que o esboço da duração foi feito a partir do esboço do EAP original, que estava simplificado e não possuía todas as atividades. Pedimos para gerar as atividades e recalcular. Além disso, foi gerado de forma muito detalhada, incluindo reuniões diárias no EAP e estimando em 24 semanas. O grupo decidiu remover isso na próxima entrega.
Aplicação no trabalho	Seção da Estrutura Analítica do Projeto (EAP).

TABELA II: REGISTRO DE USO DE IA GENERATIVA.

REFERÊNCIAS

- [1] PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 7. ed. Pensilvânia: Project Management Institute, 2021.
