

Universidade de São Paulo
ACH2027 - Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação

Prof. Doutor: Edmir Parada Vasques Prado

Ano: 2º Semestre/2026

Grupo 7 - Exercício 1

Gustavo G. França do Nascimento
15637551
T94

Kevin Rodrigues Nunes
15676030
T94

Kauã Lima de Souza
15674702
T94

Victor Yodono
13829040
T94

I. DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

De acordo com o **Guia PMBOK** (Capítulo 5 - Gerenciamento do Escopo do Projeto), a Declaração do Escopo do Projeto descreve detalhadamente as entregas do projeto e o trabalho necessário para criá-las. Ela fornece um entendimento comum do escopo entre as partes interessadas e contém as restrições, premissas e exclusões.

Abaixo está a Declaração de Escopo para o **Sistema de Controle de Acesso da EACH**.

A. Descrição do Escopo do Produto

Desenvolvimento e implantação de um sistema (software e equipamentos associados) para gerenciar e controlar a entrada e saída de pessoas e veículos nas dependências da EACH. O sistema automatizará o acesso da comunidade acadêmica (docentes, funcionários, alunos) e terceirizados regulares, além de fornecer um módulo para o cadastro, registro e liberação de visitantes. A solução contará com controle de hierarquia de acesso via senha, módulos especiais para gestão de grandes eventos e um painel para geração de relatórios gerenciais e de controle de frequência.

B. Critérios de Aceitação

Para que o projeto seja considerado concluído e aceito pela Diretoria da unidade, as seguintes condições devem ser atendidas:

- **Funcionais:** O sistema deve liberar o acesso automaticamente para usuários cadastrados (via Nº USP ou CPF) e reter visitantes até que o cadastro seja efetuado.
- **Segurança e Regras:** O acesso ao sistema de gestão deve exigir autenticação por senha e respeitar níveis hierárquicos pré-definidos (ex: administrador, operador de portaria).
- **Desempenho (Relatórios):** O sistema deve ser capaz de emitir, sem falhas, relatórios exatos de frequência de entrada de pessoas (filtrado por Nº USP e CPF) e veículos (filtrado por categoria).
- **Operacionais:** As rotinas especiais (como o pré-cadastramento em lote para eventos de grande porte) devem funcionar adequadamente, sem sobrecarregar a portaria.
- **Cronograma e Custos:** O projeto deve ser totalmente entregue e implantado no prazo máximo de 1 (um) ano, respeitando os limites orçamentários estabelecidos para equipamentos e recursos humanos.

C. Entregas do Projeto (Deliverables)

- Documento de Requisitos e Arquitetura do Sistema.
- **Módulo de Controle de Acesso:** Funcionalidades de leitura e liberação de catracas/cancelas para pessoas e veículos.
- **Módulo de Gestão de Usuários e Visitantes:** Interface para cadastro de perfis (docentes, alunos, funcionários, terceirizados e visitantes) e definição de hierarquias de acesso.
- **Módulo de Rotinas Especiais:** Área do sistema dedicada ao pré-cadastro rápido/em lote para grandes eventos.
- **Módulo de Relatórios:** Painel gerador de relatórios de controle e frequência (por Nº USP, CPF e Veículos).

- Equipamentos e materiais de controle de acesso (catracas, cancelas, leitores, etc.) comprados, instalados e configurados.
- Treinamento para a equipe de operação (portaria/segurança) e administração do sistema.

D. Exclusões do Projeto (O que está fora do escopo)

- Controle de acesso interno de portas de salas de aula, laboratórios e gabinetes (o foco é a entrada principal/-perímetro da Universidade).
- Desenvolvimento de módulos de cobrança (tarifação de estacionamento).
- Manutenção e suporte técnico contínuo do sistema após a implantação final e encerramento do projeto.
- Sistemas de câmeras de segurança (CFTV) não integrados diretamente à catraca/cancela.

E. Restrições (Constraints)

Limitações impostas ao projeto, relativas a tempo, custo, recursos e regulamentos:

- **Prazo:** A implantação total do sistema não pode ultrapassar 1 (um) ano. O desenvolvimento deve ser finalizado em agosto de 2026.
- **Orçamento (Equipamentos):** O gasto com aquisição de equipamentos e materiais está limitado à faixa de R\$ 300.000,00 a R\$ 600.000,00.
- **Orçamento (Bolsas):** O custo com alunos está restrito ao fornecimento de 5 a 8 bolsas de R\$ 2.000,00 mensais cada, pelo período exato de 6 meses.
- **Recursos Humanos:** O desenvolvimento do sistema é restrito à participação de alunos do último ano de SI (onde a atividade contará como estágio obrigatório) **OU** à contratação de uma Start-Up da incubadora da EACH.
- A equipe exige a presença de um Líder de Projeto subordinado à Diretoria e um Analista de Sistemas Sênior (graduado em SI).

F. Premissas (Assumptions)

Fatores considerados verdadeiros, reais ou certos para fins de planejamento:

- A administração da Universidade (USP/EACH) fornecerá acesso seguro e integrado à base de dados atual de docentes, funcionários e alunos (Números USP, CPFs e dados de veículos) para a carga inicial do sistema.
- As instâncias acadêmicas competentes aprovarão a participação dos alunos no projeto para validação dos créditos de estágio de graduação a tempo do início em agosto de 2026.
- Caso a opção escolhida seja o uso de alunos bolsistas, haverá alunos de SI suficientes, capacitados e interessados no último ano letivo para preencher as 5 a 8 vagas.
- A infraestrutura física e de rede da EACH nos pontos de entrada (portarias) suportará a instalação dos novos equipamentos sem necessidade de obras civis complexas e fora do orçamento previsto.

II. ESBOÇO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) apresenta a decomposição hierárquica do trabalho necessário para atingir os objetivos do projeto. O diagrama a seguir ilustra as principais fases e entregas.

III. REGISTRO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Em conformidade com a Política de Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa da disciplina ACH2027, declaramos explicitamente a utilização de IA como suporte ao aprendizado, ideação e estruturação deste documento.

REFERÊNCIAS

- [1] PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 7. ed. Pensilvânia: Project Management Institute, 2021.

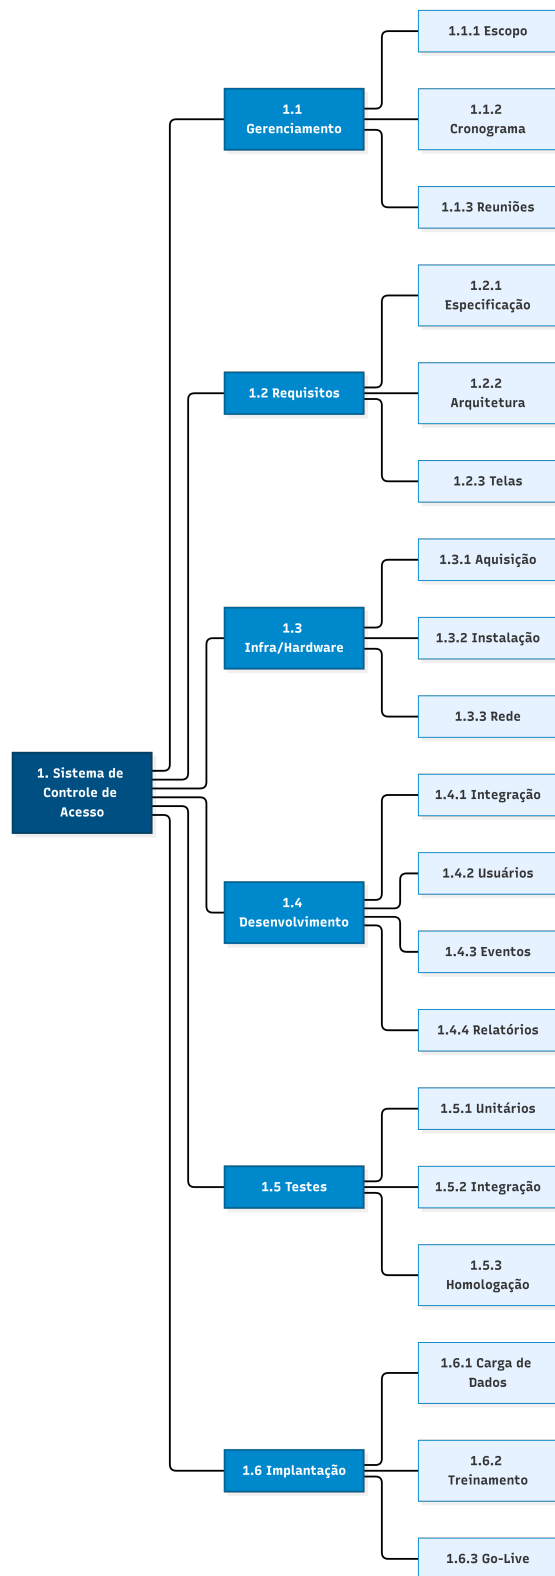


FIGURA I: ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

Registro de Uso de IA	Registro 01: Declaração de Escopo e LaTeX	Registro 02: Diagramação da EAP (Mermaid)
Problema / Objetivo	Elaborar a Declaração de Escopo (PMBOK) a partir do caso semestral da atividade proposta e formatar o conteúdo no template LaTeX do grupo.	Criar o diagrama visual da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e gerar o código exportável para o Overleaf.
Ferramenta de IA	Gemini 3.1 Pro (Setembro/2026).	Gemini 3.1 Pro (Setembro/2026).
Comandos	"Com base no projeto a seguir, elabore a declaração de escopo... do PMBOK" e "Formate isso no seguinte latex...".	"faça um esboço da estrutura analítica... precisa ser um diagrama" e "me de um mermaid... ficou muito largo horizontalmente".
Revisão dos resultados	A primeira versão não abordava detalhes técnicos de software. Perguntamos se era necessário e recebemos um detalhamento de questões como Open Source e LGPD. Decidimos não incluir, já que a declaração do escopo é uma visão alto nível de gestão.	O formato padrão (Top-Down) do Mermaid extrapolava as margens da página. Ajustamos as instruções para gerar formatos otimizados (Left-Right) adequados ao papel A4 no Overleaf.
Aplicação no trabalho	Seção de Declaração de Escopo do Projeto.	Seção da Estrutura Analítica do Projeto (EAP).

TABELA I: REGISTRO DE USO DE IA GENERATIVA.
